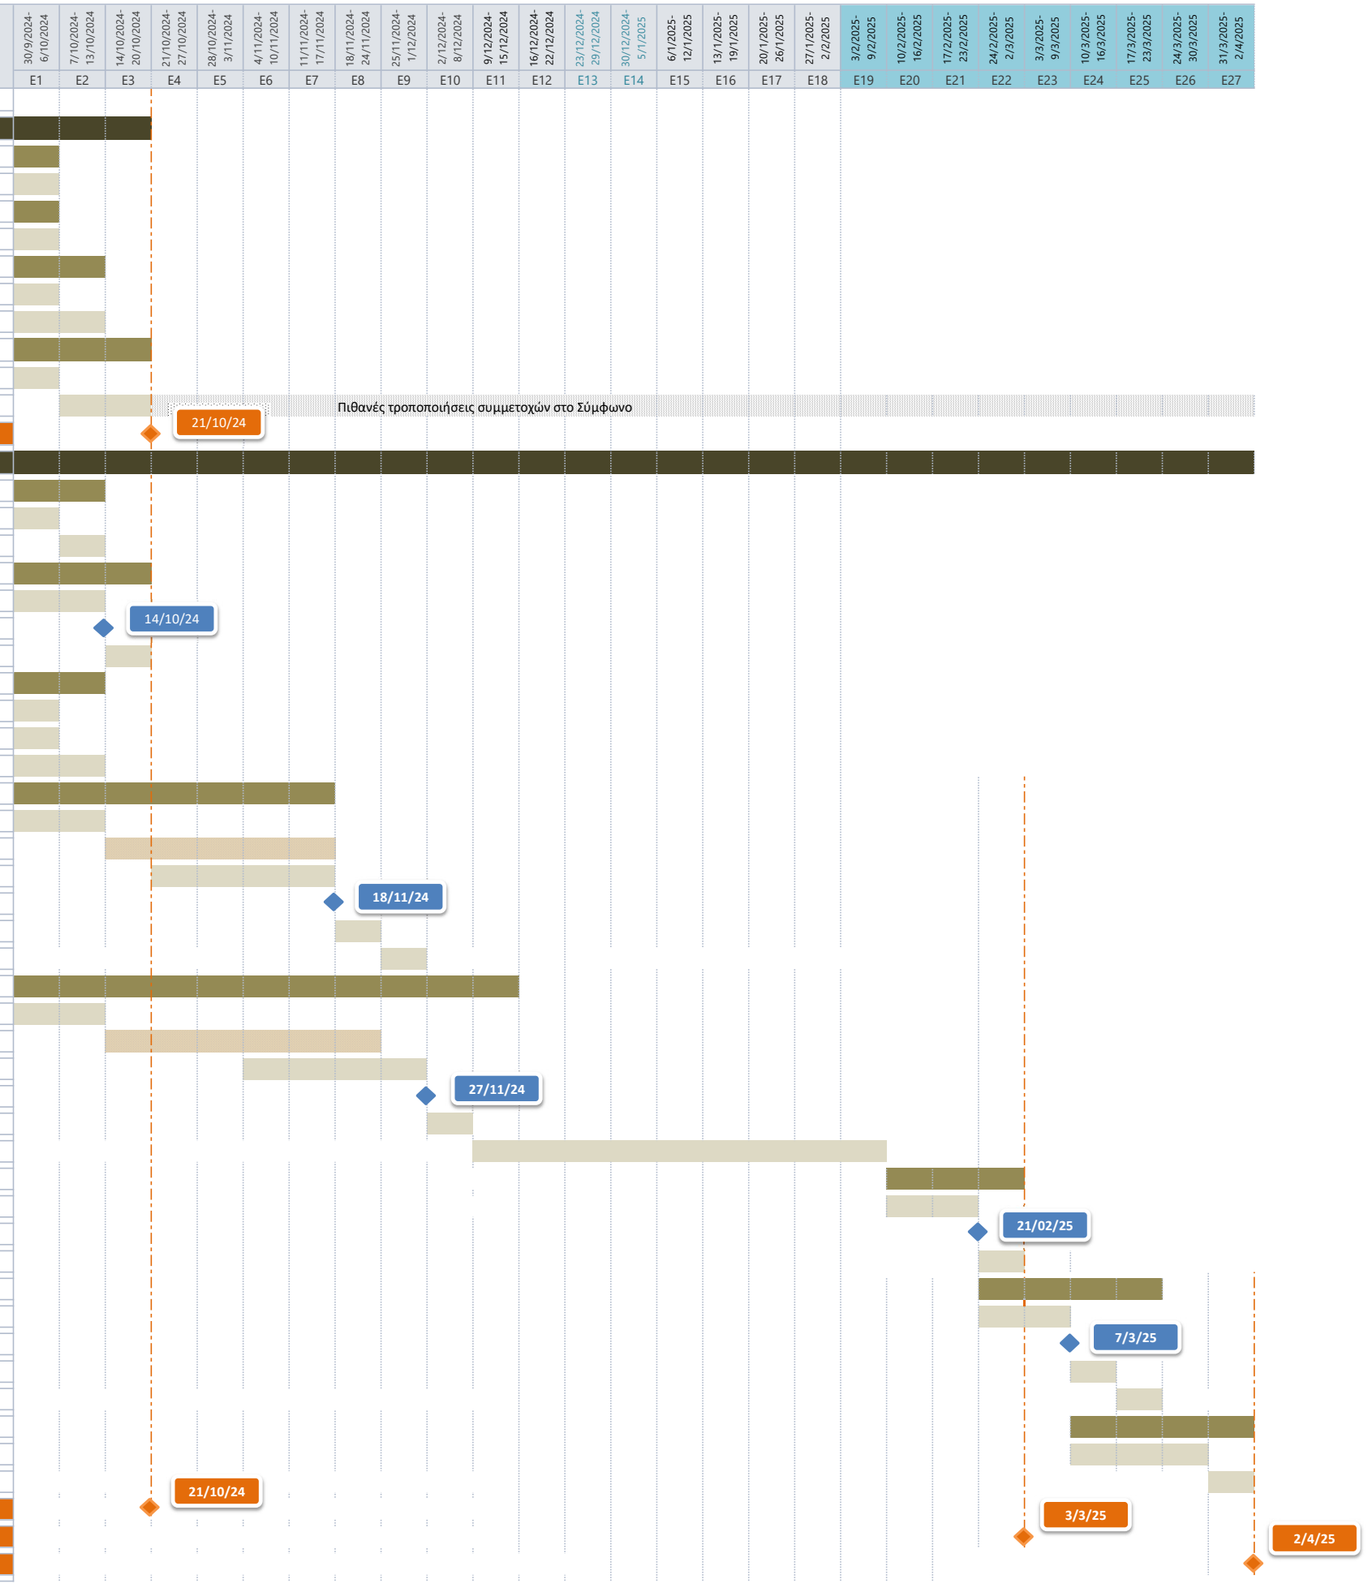Εργασία	30/9/2024-6/10/2024	7/10/2024-13/10/2024	14/10/2024-20/10/2024	21/10/2024-27/10/2024	28/10/2024-3/11/2024	4/11/2024-10/11/2024	11/11/2024-17/11/2024	18/11/2024-24/11/2024	25/11/2024-1/12/2024	2/12/2024-8/12/2024	9/12/2024-15/12/2024	16/12/2024-22/12/2024	23/12/2024-29/12/2024	30/12/2024-5/1/2025	6/1/2025-12/1/2025	13/1/2025-19/1/2025	20/1/2025-26/1/2025	27/1/2025-2/2/2025	3/2/2025-9/2/2025	10/2/2025-16/2/2025	17/2/2025-23/2/2025	24/2/2025-2/3/2025	3/3/2025-9/3/2025	10/3/2025-16/3/2025	17/3/2025-23/3/2025	24/3/2025-30/3/2025	31/3/2025-2/4/2025
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E26	E27
ΣΒΑΚ Δήμου Αγιάς																											
ΦΑΣΗ Α - Φάση προετοιμασίας του ΣΒΑΚ																											
Α.1 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (ΟΕ)																											
Δρ-Α.1: Απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση της ΟΕ - μέλη, επικεφαλής, αρμοδιότητες, κλπ.																											
Α.2 Δημιουργία ιστοσελίδας ΣΒΑΚ																											
Δρ-Α.2: Δημιουργία & θέση σε λειτουργία της ιστοσελίδας ΣΒΑΚ στον ιστότοπο του δήμου																											
Α.3 Δημιουργία Δικτύου Φορέων (ΔΦ)																											
Δρ-Α.3.1: Σύνταξη & ανάρτηση δημόσιας πρόσκλησης για συμμετοχή στο ΔΦ, στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
Δρ-Α.3.2: Σύνταξη & αποστολή μεμονωμένων έγγραφων προσκλήσεων για συμμετοχή στο ΔΦ																											
Α.4 Σύνταξη & υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων (ΔΦ)																											
Δρ-Α.4.1: Σύνταξη Συμφώνου Συμμετοχής (αποστολή με τις έγγραφες προσκλήσεις & ανάρτηση του μη υπογεγραμμένου)																											
Δρ-Α.4.2: Υπογραφή & ανάρτηση του υπογεγραμμένου Συμφώνου Συμμετοχής, στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ (Προαιρετική Εργασία)																											
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1																											
ΦΑΣΗ Β - Φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ																											
Β.1 Καθορισμός Σχεδίου Συμμετοχής φορέων & πολιτών στην κατάρτιση του ΣΒΑΚ																											
Δρ-Β.1.1: Σύνταξη Σχεδίου Συμμετοχής - Πλάνο διαβούλευσης & επικοινωνίας																											
Δρ-Β.1.2: Ανάρτηση του Σχεδίου Συμμετοχής, στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
Β.2 Πραγματοποίηση 1ης δημόσιας διαβούλευσης																											
Δρ-Β.2.1: Προετοιμασία υλικού (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)																											
Δρ-Β.2.2: Πραγματοποίηση 1ης δημόσιας διαβούλευσης																											
Δρ-Β.2.3: Σύνταξη & ανάρτηση παραδοτέου με τα αποτελέσματα της 1ης δημόσιας διαβούλευσης																											
Β.3 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας																											
Δρ-Β.3.1: Συλλογή στοιχείων																											
Δρ-Β.3.2: Σύνταξη παραδοτέου με τα αποτελέσματα ανάλυσης & αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης																											
Δρ-Β.3.3: Ανάρτηση του παραδοτέου ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
Β.4 Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων & Στόχων του ΣΒΑΚ																											
Δρ-Β.4.1: Προετοιμασία διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - Ερωτ/γιο προσδοκίες για το μέλλον																											
Δρ-Β.4.2: Πραγματοποίηση διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - προσδοκίες για το μέλλον																											
Δρ-Β.4.3: Προετοιμασία Εργαστηρίου (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)																											
Δρ-Β.4.4: Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με συμμετοχή ΟΕ & ΔΦ																											
Δρ-Β.4.5: Σύνταξη παραδοτέου (αποτελέσματα Εργαστ., οριστικοποίηση οράματος/ προτεραιοτήτων/ στόχων)																											
Δρ-Β.4.6: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
Β.5 Κατάρτιση εναλλακτικών Σεναρίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας																											
Δρ-Β.5.1: Προετοιμασία διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - Ερωτ/γιο μέτρα & πολιτικές																											
Δρ-Β.5.2: Πραγματοποίηση διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου - μέτρα & πολιτικές																											
Δρ-Β.5.3: Προετοιμασία Εργαστηρίου - κατάρτιση 2 σεναρίων																											
Δρ-Β.5.4: Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με συμμετοχή ΟΕ																											
Δρ-Β.5.5: Σύνταξη παραδοτέου (αποτελέσματα Εργαστ., οριστικοποίηση των 2 σεναρίων)																											
Δρ-Β.5.6: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
Β.6 Πραγματοποίηση 2ης δημόσιας διαβούλευσης																											
Δρ-Β.6.1: Προετοιμασία υλικού (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)																											
Δρ-Β.6.2: Πραγματοποίηση 2ης δημόσιας διαβούλευσης																											
Δρ-Β.6.3: Σύνταξη & ανάρτηση παραδοτέου με τα αποτελέσματα της 2ης δημόσιας διαβούλευσης																											
Β.7 Επιλογή βέλτιστου Σεναρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας																											
Δρ-Β.7.1: Προετοιμασία Εργαστηρίου (προσκλήσεις, ατζέντα, παρουσιάσεις, κλπ.)																											
Δρ-Β.7.2: Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με συμμετοχή ΟΕ & ΔΦ																											
Δρ-Β.7.3: Σύνταξη παραδοτέου (αποτελέσματα Εργαστ., οριστικοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου)																											
Δρ-Β.7.4: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
Β.8 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου																											
Δρ-Β.8.1: Σύνταξη παραδοτέου με το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) & το Σχέδιο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (Π&Α)																											
Δρ-Β.8.2: Ανάρτηση του παραδοτέου στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ																											
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2.1 (Εργασίες Β.1, Β.2, Β.3)																											
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2.2 (Εργασίες Β.4, Β.5, Β.6)																											
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2.3 (Εργασίες Β.7, Β.8)
